


Vredebergkerk in de steigers

In de Meerjarenonderhoudsplanning 2016 – 2025 staat een technische ingreep voor de Vredebergkerk vermeld voor wat betreft het vervangen van alle voegwerk en herstel van scheuren in metselwerk. Vanaf februari 2017 is het CVK gestart met de voorbereidingen om deze ingreep te realiseren.

Het werk is op 18 september gestart!

- De hovenier heeft alle struiken in de groenstrook langs de oostgevel verwijderd.
- De steigerbouwers zijn druk bezig de zuid- en oostgevel in de steigers te zetten volgens de tekeningen (zie foto).
- Eerder dan gepland zijn de voeghakkers/-slijpers aan het werk gegaan. De oude voegen van de oostgevel en zuidgevel zijn inmiddels uitgehakt. We lopen dus voor op de planning, mede dankzij de gunstige weersomstandigheden.
- Volgende week (v.a. 25 september) zullen de proefstukken voor het nieuwe voegwerk opgezet worden ter beoordeling. Dat is een belangrijk moment.
- Daarna kan de aannemer gestaag door met het werk volgens planning.

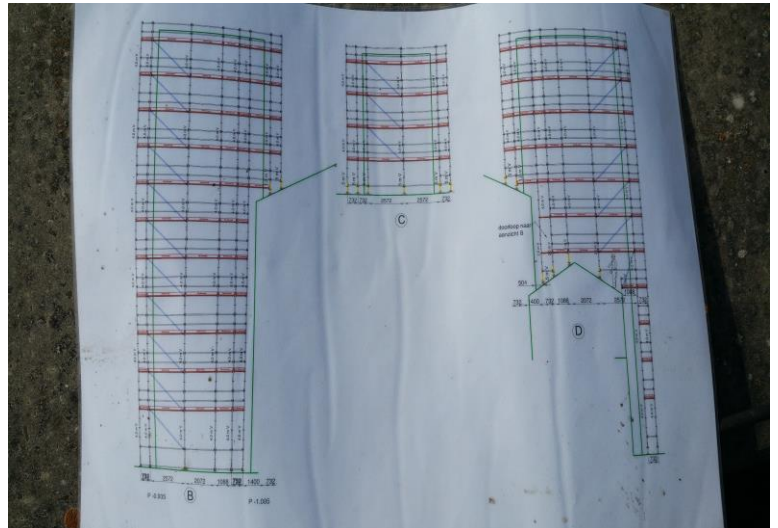

Het CVK is zich ervan bewust dat deze bouwkundige ingreep ingrijpend is, maar heeft er voor gekozen om op deze wijze de ingreep in één keer en financieel zo gunstig mogelijk uit te laten voeren.

Voor alle kerkgangers, gebruikers en omwonenden kan er op zeker moment overlast optreden. Wij hopen op uw begrip.

Mocht u tijdens bovengenoemde periode ernstige onrechtmatigheden constateren neemt u dan direct contact op met de projectleider namens het CVK: Rob van Doorn (06-53825906) of r.van.doorn1@online.nl.

Het College van Kerkrentmeesters.
